


Remplacement d'un switch et brassage de la baie

Nouveau switch administrable, recâblage et supervision avec Omada Cloud

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>

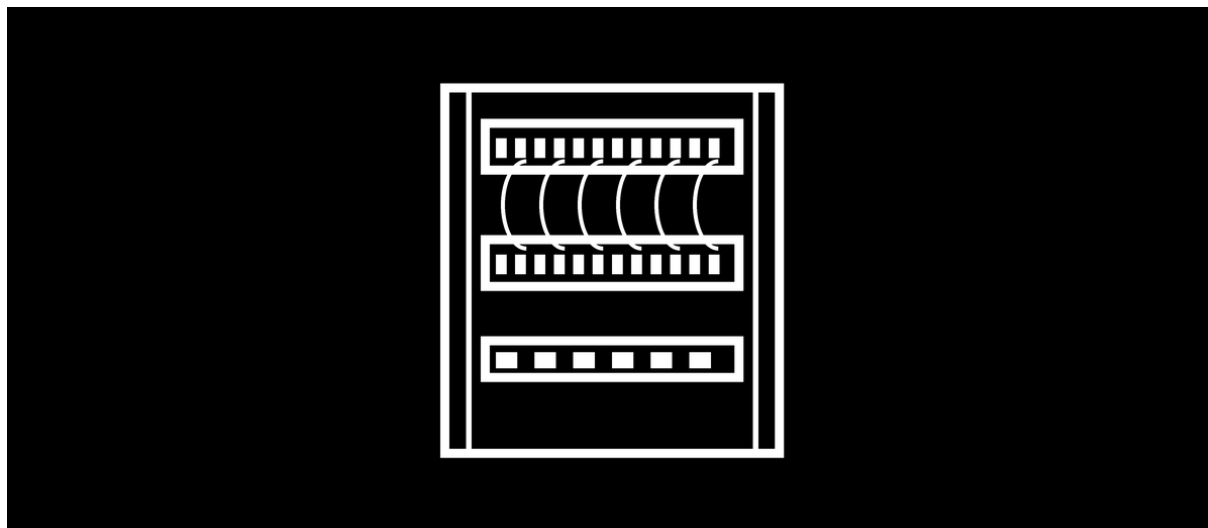

La **baie de brassage** regroupe les équipements réseau d'un étage. Le **brassage** consiste à relier, avec des cordons, les prises du **panneau de brassage** (qui mènent aux bureaux) aux ports du **switch**, qui distribue le réseau aux postes.

Ici, on remplace l'ancien switch **24 ports** par un switch **administrable** plus grand, on refait le brassage **proprement**, puis on supervise les ports à distance avec **Omada Cloud**.

- **Objectif** : mieux gérer le réseau et **aérer la baie** ;
- **Matériel** : switch administrable L2+ **TP-Link TL-SG3452P** (52 ports Gigabit, dont 48 en PoE+) ;
- **Logiciel** : **Omada Cloud** (voir la fiche Omada).

1. Avant : l'ancien switch

L'ancien switch 24 ports et ses câbles :



2. Après : nouveau switch et brassage



Le **nouveau switch** est installé et la baie est **brassée proprement**, pour une **bonne visibilité** sur chaque câble et chaque port.

3. Supervision avec Omada Cloud

Omada Cloud donne une **vision complète**, en direct, de l'utilisation des ports de la baie par les utilisateurs :

